Appalto n. 02/2016 Scuola Via *Strozzi* - cronoprogramma 14/11/2023

N.	Nome attività	durata		data inizio	data fine	lug 22	ago 22	set 22	ott 22	nov 22	dic 22	gen 23	feb 23	mar 23	apr 23	mag 23	giu 23	lug 23	ago 23	set 23	ott 23	nov 23	dic 23	gen 24	feb 24	mar 24	apr 24	mag 24	giu 24	lug 24	ago 24	set 24	ott 24	nov 24	dic 24	gen 25	feb 25	mar 25	apr 25	mag 25	giu 25	lug 25	ago 25	set 25	ott 25	nov 25	gen 26	feb 26	mar 26	apr 26	mag 26	giu 26	lug 26
1	**Bonifica - Nuove Opere**																																																				
2	Redazione Piano Caratterizzazione	25	gg	11/07/2022	05/08/2022	x	x																																														
3	Convocazione CdS	60	gg	06/08/2022	05/10/2022		x	x	x																																												
4	Approvazione Piano caratterizzazione	30	gg	06/10/2022	05/11/2022				x	x																																											
5	Prenotazione ARPA per attività di campo	45	gg	06/11/2022	21/12/2022					x	x																																										
6	Esecuzione attività di campo	7	gg	22/12/2022	29/12/2022						x																																										
7	Esiti analisi laboratorio di parte	21	gg	30/12/2022	20/01/2023						x	x																																									
8	Esiti analisi laboratorio ARPA	60	gg	30/12/2022	28/02/2023							x	x																																								
9	Presentazione previsione progettuale	0	gg	04/09/2023	04/09/2023																																																
10	Ulteriori indagini in campo	2	gg	17/10/2023	19/10/2023																																																
11	Anasili e trasmissione risultati	12	gg	19/10/2023	31/10/2023																																																
12	redazione quadro economico (soluzioni best case e worst case) e relazione tecnica	0	gg	10/12/2023	10/12/2023																																																
13	redazione e deposito progetto di bonifica	60	gg	30/11/2023	29/01/2024																																																
14	Approvazione progetto*	90	gg	30/01/2024	29/04/2024																																																
15	Esecuzione lavori di Bonifica	90	gg	30/04/2024	29/07/2024																																																
16	Certificazione bonifica*	120	gg	30/07/2024	27/11/2024																																																
17	Inizio lavori Edili	610	gg	28/11/2024	31/07/2026																																																

* nota: tempistiche stimate

Appalto n. 02/2016 Scuola Via *Strozzi* - cronoprogramma 14/11/2023

	Nome attività	durata		data inizio	data fine
1	Bonifica - Nuove Opere				
2	Redazione Piano Caratterizzazione	25	gg	11/07/2022	05/08/2022
3	Convocazione CdS	60	gg	06/08/2022	05/10/2022
4	Approvazione Piano caratterizzazione	30	gg	06/10/2022	05/11/2022
5	Prenotazione ARPA per attività di campo	45	gg	06/11/2022	21/12/2022
6	Esecuzione attività di campo	7	gg	22/12/2022	29/12/2022
7	Esiti analisi laboratorio di parte	21	gg	30/12/2022	20/01/2023
8	Esiti analisi laboratorio ARPA	60	gg	30/12/2022	28/02/2023
9	Presentazione previsione progettuale	0	gg	04/09/2023	04/09/2023
10	Ulteriori indagini in campo	2	gg	17/10/2023	19/10/2023
11	Anasili e trasmissione risultati	12	gg	19/10/2023	31/10/2023
12	redazione quadro economico (soluzioni best case e worst case) e relazione tecnica	0	gg	10/12/2023	10/12/2023
13	redazione e deposito progetto di bonifica	60	gg	30/11/2023	29/01/2024
14	Approvazione progetto*	90	gg	30/01/2024	29/04/2024
15	Esecuzione lavori di Bonifica	90	gg	30/04/2024	29/07/2024
16	Certificazione bonifica*	120	gg	30/07/2024	27/11/2024
17	Inizio lavori Edili	610	gg	28/11/2024	31/07/2026

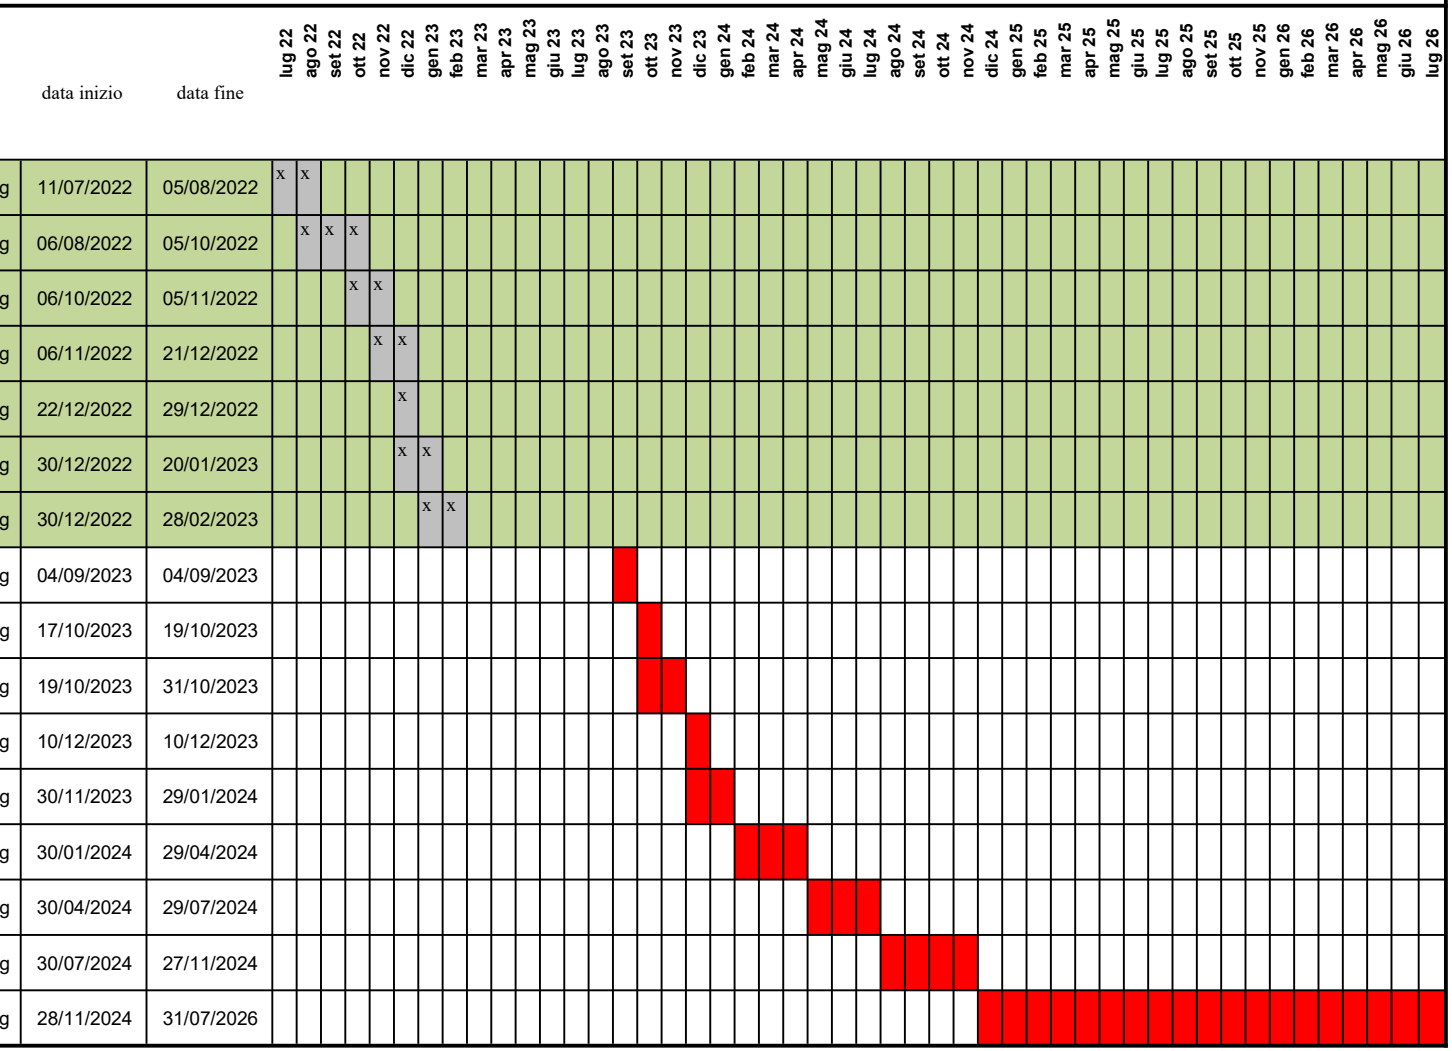

* nota: tempistiche stimate

Appalto n. 02/2016 Scuola Via *Strozzi* - cronoprogramma 14/11/2023

	Nome attività	durata		data inizio	data fine
1	Bonifica - Nuove Opere				
2	Redazione Piano Caratterizzazione	25	gg	11/07/2022	05/08/2022
3	Convocazione CdS	60	gg	06/08/2022	05/10/2022
4	Approvazione Piano caratterizzazione	30	gg	06/10/2022	05/11/2022
5	Prenotazione ARPA per attività di campo	45	gg	06/11/2022	21/12/2022
6	Esecuzione attività di campo	7	gg	22/12/2022	29/12/2022
7	Esiti analisi laboratorio di parte	21	gg	30/12/2022	20/01/2023
8	Esiti analisi laboratorio ARPA	60	gg	30/12/2022	28/02/2023
9	Presentazione previsione progettuale	0	gg	04/09/2023	04/09/2023
10	Ulteriori indagini in campo	2	gg	17/10/2023	19/10/2023
11	Anasili e trasmissione risultati	12	gg	19/10/2023	31/10/2023
12	redazione quadro economico (soluzioni best case e worst case) e relazione tecnica	0	gg	10/12/2023	10/12/2023
13	redazione e deposito progetto di bonifica	60	gg	30/11/2023	29/01/2024
14	Approvazione progetto*	90	gg	30/01/2024	29/04/2024
15	Esecuzione lavori di Bonifica	90	gg	30/04/2024	29/07/2024
16	Certificazione bonifica*	120	gg	30/07/2024	27/11/2024
17	Inizio lavori Edili	610	gg	28/11/2024	31/07/2026

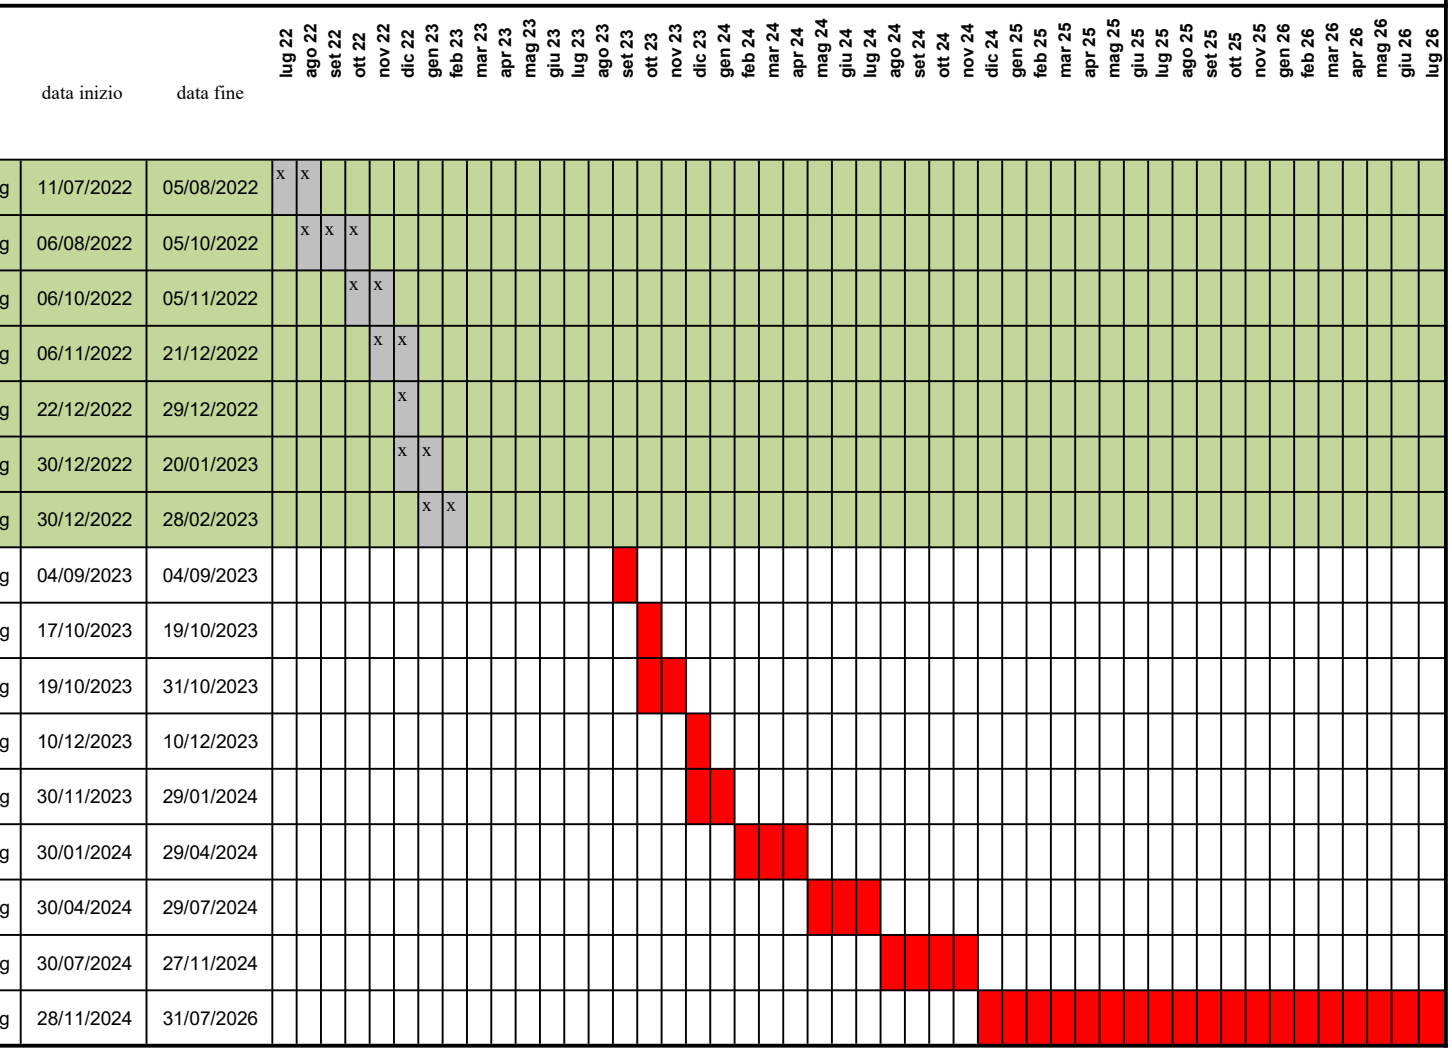

* nota: tempistiche stimate
